



Comune di - Commune de - Gemeinde

GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal - Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it -
 Pec: protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it

Prot. n. 1185

Dal Municipio, li 23.02.2022

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Intervento di fornitura e posa valvola di controllo vasca di Netscho
(art. 163, D.lgs. n. 50/2016)

Il giorno 23 febbraio 2022, a seguito di segnalazione verbale del Sindaco pervenuta in data 21.02.2022, il sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico comunale, Arch. Stefania Rollandoz, ha svolto le necessarie indagini al fine di accertare la situazione segnalata inerente ad un malfunzionamento di un'apparecchiatura sita all'interno della vasca dell'acquedotto di Netscho, identificata in catasto al foglio 13 mappale n. 493, che non garantisce il corretto funzionamento della rete acquedottistica della porzione sud del territorio comunale, svuotando l'acqua nel troppopieno e provocando pertanto una carenza di approvvigionamento di acqua, accertando una situazione di criticità da ripristinare ai fini del corretto funzionamento della rete acquedottistica comunale nel tratto interessato e della salvaguardia della quantità della risorsa idrica.

A seguito del sopralluogo, richiesto dall'Amministrazione comunale ed effettuato in data 22 febbraio 2022 da parte del personale comunale, è stata redatta una preventiva descrizione e valutazione dell'intervento da effettuare per il ripristino del corretto funzionamento della rete acquedottistica nel tratto interessato tramite fornitura e posa di una valvola di controllo all'interno della vasca, probabilmente danneggiatosi a causa della vetustà delle attrezzature installate all'interno del serbatoio dell'acquedotto comunale in Loc. Netscho. Attualmente all'interno della vasca sita in Loc. Netscho il galleggiante ivi installato risulta malfunzionante e non più in grado di effettuare un controllo sull'approvvigionamento idrico, pertanto la quantità di acqua che viene immessa alla vasca di cui trattasi risulta superiore rispetto alla richiesta. Tale guasto provoca lo scarico dell'acqua in eccesso nel troppo pieno, provocando pertanto uno spreco della risorsa idrica, che invece potrebbe essere riutilizzata in altre aree del territorio in cui vi è carenza di acqua.

Al fine di garantire nuovamente il corretto funzionamento della rete acquedottistica, salvaguardando la risorsa idrica, si intende intervenire con la fornitura e posa in opera di una valvola di controllo del livello del serbatoio di tipo Athena PN 10/16 DN 65, comprensiva di materiali, tubazioni, flange e quanto necessario al corretto funzionamento della valvola. Tale attrezzatura permette di interrompere l'immissione di acqua nella vasca di Netscho nel momento in cui la stessa risulta piena, garantendo un accumulo di acqua nella condotta che eventualmente può essere reindirizzata in porzioni del territorio che presentano carenza di risorsa idrica. Con l'installazione della valvola di controllo si evitano gli sprechi della risorsa idrica e si riducono la carenza di approvvigionamento.

Visti inoltre:

- R.D. 25-7-1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il vigente Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.09.2017 (su BUR n. 48 del 31.10.2017).

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in regime di somma urgenza.

L'intervento di somma urgenza per l'esecuzione delle necessarie misure di salvaguardia della risorsa idrica e riduzione degli sprechi con la sostituzione del galleggiante danneggiato e la posa in opera di una valvola di controllo all'interno della vasca di Netscho, è stato dimensionato e identificato mediante il coinvolgimento di un'impresa qualificata operante nel territorio di Gressoney, come da proposta allegata al presente verbale.

CONSIDERATO che


- permane uno stato di emergenza con rischio di carenza di acqua per il malfunzionamento di un tratto di rete acquedottistica comunale;
- l'Amministrazione comunale - a titolo precauzionale - si è attivata per verificare lo stato di emergenza e per far pronte alla perdita dell'acquedotto comunale;
- pertanto, è necessario intervenire mediante l'attivazione di un pronto intervento per l'esecuzione di lavori di somma urgenza volti alla sostituzione del galleggiante danneggiato con posa in opera di una valvola di controllo all'interno della vasca di Netscho, costituente in:
 - rimozione del galleggiante danneggiato;
 - fornitura e installazione di una valvola di controllo del serbatoio CSA modello Athena PN 10/16 DN 65;
 - collegamento della valvola con tubazioni, materiali e flange necessari;
 - ogni opera per dare l'intervento ultimato a regola d'arte;
- le opere di fornitura e posa valvola di controllo all'interno della vasca di Netscho ammontano a un importo stimato, a corpo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 3.180,00, oltre IVA 22% (pari a lordi euro 3.879,60);
- le opere di fornitura e posa in opera di valvola di controllo all'interno della vasca di Netscho dovranno avere immediato avvio e durata pari a circa 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'intervento;
- l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, vengono affidati all'Impresa RIAL IMPIANTI S.r.l., con sede in loc. Tschemenoal n. 18 in 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), C.F. e P.IVA 00441890076;
- i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'Amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative, nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite.

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta Arch. Stefania Rollandoz, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, dichiara con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.


Il tecnico verbalizzante (Arch. Stefania Rollandoz)

L'Impresa RIAL IMPIANTI S.r.l. (Ervin Rial)

Visto: Il Sindaco (Alessandro Girod)



CATASTALE - Fg. 13 n. 493

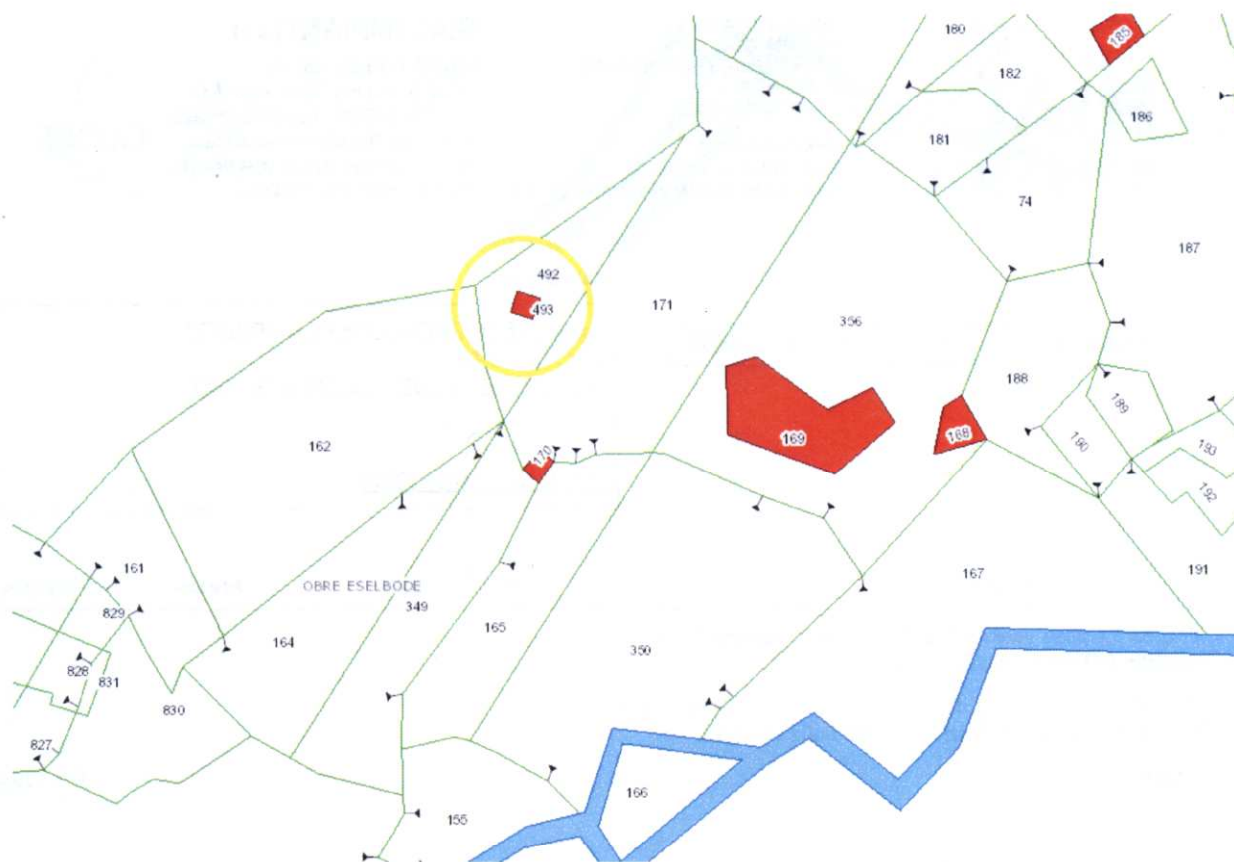

ORTOFOTO



PREVENTIVO LAVORI



- IMPIANTI IDRAULICI
- ACQUEDOTTI
- INNEVAMENTO PROGRAMMATO
- FOGNATURE
- COSTRUZIONI EDILI

www.rialimpianti.it
e-mail: info@rialimpianti.it
p.e.c.: amministrazione@pc.rialimpianti.it

RIAL IMPIANTI s.r.l.

Località Tschemenal, 18
11025 Gressoney-Saint-Jean (Ao)
Tel. 0125.355930 - Fax 0125.359828
N° iscrizione Registro Imprese di Aosta,
codice fiscale e partita IVA: 00441890076
Capitale sociale: € 50.000,00 i.v.

**Destinatario**

Preventivo nr. **6** del **22/02/2022**

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE'
Loc. Tache 14/A
11020 GRESSONEY-LA-TRINITE' (AO)

C.F./P.Iva 00109710079

Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Importo
Fornitura e posa valvola di controllo livello serbatoi CSA modello ATHENA PN 10/16 DN 65				
Trasporto a piè d'opera dei materiali, tubazioni flange e tutto quanto necessario al funzionamento della valvola				
Il tutto a corpo				€ 3.180,00

Pagamento:

22sp: Imp. 22%

Acconto:

Totale imponibile € 3.180,00

Totale imposta Iva € 699,60

Tot. documento € 3.879,60
